



Tiefbauarbeiten SBB

Schwarzenbach Gl. 4-54

Bauherr

SBB AG

Bauzeitraum

28.08.2022 - 21.10.2022

Projektdauer

35 Schichten (Ausführung mit Bauzug)

Hauptmengen

29m Entwässerung Typ 4a

440m Entwässerung Typ 4b

140 m Banketthalterung Rügglei

70 m Einbau Kabelkanal Typ T23

Projektbeschreibung

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung im Bereich des Bahnhof Schwarzenbach durften wir sämtliche Gleisteifbauarbeiten für die SBB durchführen. Die Arbeiten beinhalteten die Erstellung von neuen Banketthalterungen (Typ Winkelgitter), Verlegen von Kabelkanälen, sowie eine neue Entwässerung.

Die Arbeiten fanden hauptsächlich nachts während der Betriebspause mit zwei bis drei gleichzeitig operierenden Arbeitsgruppen statt.

Für den Umschalung des Aushubmaterials und des Neumaterials kamen unsere DHS-Wagen und Facs-Xs Wagen zum Einsatz.


Mengengerüst:

29m Entwässerung Typ 4a

440m Entwässerung Typ 4b

140 m Banketthalterung Rügglei

70 m Einbau Kabelkanal Typ T23

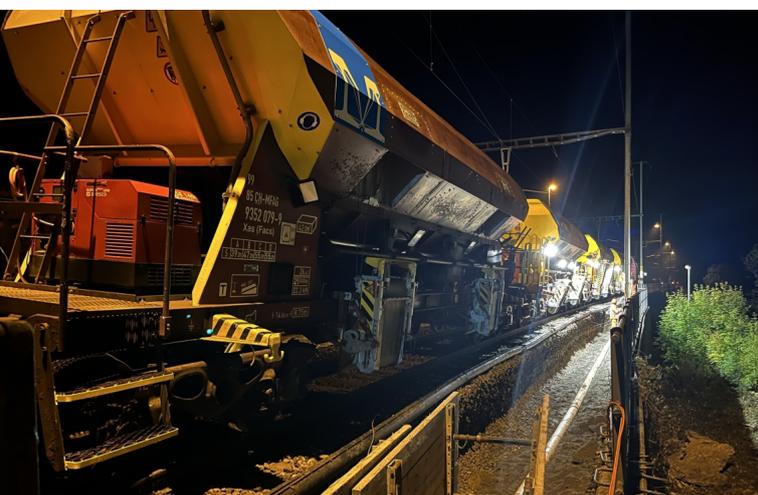

Mario von Arx
Leiter Standort Mitte

+41 52 557 91 00
m.vonarx@mueller-gleisbau.ch

